


Freileitungen und Erdkabel im Nahkampfmitteldepot Hembergen (Eine Zeichnung von Manfred Rech)

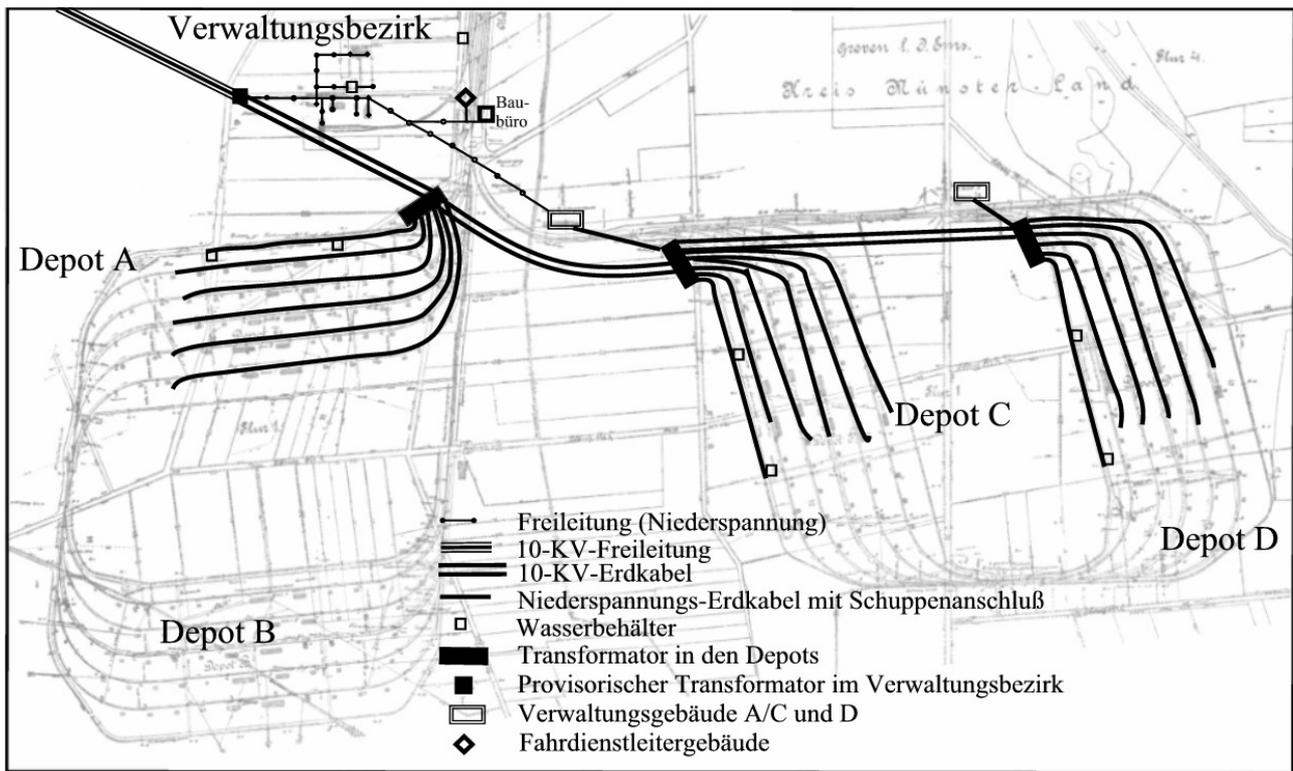

Erdkabel im gesamten Depot

Geplante Erdkabel			Gelegte Erdkabel	
10-kV-Erdkabel				
Vom	Bis	Meter	Ausführung	Meter
Provisorischen Trafo	Trafo im Depot A	550m	Es wurden gelegt	550m
Trafo im Depot A	Trafo im Depot C	750m	Es wurden gelegt	750m
Trafo im Depot C	Trafo im Depot D	800m	Es wurden gelegt	800m
Provisorischen Trafo	Trafo im Depot B	1.000m	Nicht gelegt	-
Niederspannungs-Erdkabel				
Trafo im Depot A	zu allen 52 Schuppen und zu beiden Wasserbehältern (6 Trassen)	5.850m	Es wurden gelegt 4.900m	10.550m
Trafo im Depot C	zu allen 52 Schuppen und zu beiden Wasserbehältern (6 Trassen)	5.850m	Es wurden gelegt 2.600m	
Trafo im Depot D	zu allen 52 Schuppen und zu beiden Wasserbehältern (6 Trassen)	5.850m	Es wurden gelegt 3.050m	
Trafo im Depot C	Doppelverwaltungsgebäude A/C	350m	Es wurden gelegt	350m
Trafo im Depot D	Verwaltungsgebäude D	200m	Es wurden gelegt	200m
Trafo im Depot B	Verwaltungsgebäude B	250m	Nicht gelegt	-
Trafo im Depot B	zu allen 52 Schuppen und zu beiden Wasserbehältern (6 Trassen)	5.850m	Nicht gelegt	-
Geplante Länge der Erdkabel		27.300m	Gelegte Erdkabel	13.200m
			Es lagen in den Depots verteilt auf 30 Trommeln insgesamt ca.	4.500m
			Insgesamt vorhandene Erdkabel	17.700m
			Es fehlten noch ca.	9.600m

Anmerkung: Die Berechnungen basieren auf Schriftstücken und Abmessungen vorliegender Pläne und Fotografien.
